

Hoja de pedido / presupuesto

Veneciana exterior Solomatic II



Nº Cliente

Nombre

Población

Agencia

Fecha

☐ Presupuesto

☐ Pedido

Ref. Obra

Nº Pedido


Color lama

Ref.	Cantidad	HL (440-4500)	BK (600-4500)	Tipo guía		Lama		Montaje		Motor		Posición motor desde dentro		Opción tapa/cajón (solo en montaje intramuros)		
				Fix L	Cable	70	80	Intramuros	Extramuros	Mec.	Radio	Dcha.	Izq.	Frontal	Doble	Cajón túnel

Toma de medidas:
BK Intramuros Fix L = Ancho luz hueco -4 mm
BK Intramuros Cable = Ancho luz hueco -20 mm
BK Extramuros Fix L = Ancho luz hueco +40 mm
Alto total Intramuros Cable = Alto luz hueco -62 mm

HL x BK ≤ 15 m2

Observaciones

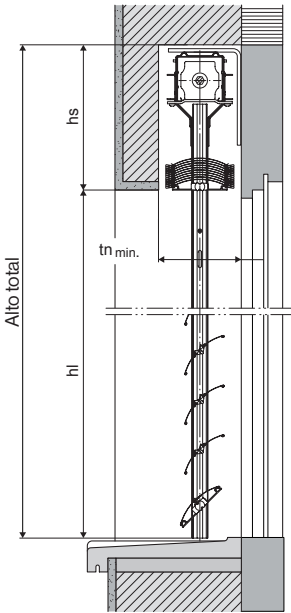

hl: altura luz
hs: altura nicho
tn solomatic II 70 = 100 mm
tn solomatic II 80 = 120 mm

Solomatic II 70

hl	hs	Alto total
1000	180	1180
1050	195	1245
1100	195	1295
1150	195	1345
1200	195	1395
1250	210	1460
1300	210	1510
1350	210	1560
1400	210	1610
1450	210	1660
1500	210	1710
1550	225	1775
1600	225	1825
1650	225	1875
1700	225	1925
1750	240	1990
1800	240	2040
1850	240	2090
1900	240	2140
1950	240	2190
2000	240	2240
2050	255	2305
2100	255	2355
2150	255	2405

hl	hs	Alto total
2200	255	2455
2250	270	2520
2300	270	2570
2350	270	2620
2400	270	2670
2450	270	2720
2500	270	2770
2550	285	2835
2600	285	2885
2650	285	2935
2700	285	2985
2750	295	3045
2800	295	3095
2850	295	3145
2900	295	3195
2950	295	3245
3000	310	3310
3050	310	3360
3100	310	3410
3150	310	3460
3200	310	3510
3250	325	3575
3300	325	3625
3350	325	3675

hl	hs	Alto total
3400	325	3725
3450	325	3775
3500	340	3840
3550	340	3890
3600	340	3940
3650	340	3990
3700	355	4055
3750	355	4105
3800	355	4155
3850	355	4205
3900	355	4255
3950	355	4305
4000	370	4370
4050	370	4420
4100	370	4470
4150	370	4520
4200	370	4570
4250	385	4635
4300	385	4685
4350	385	4735
4400	385	4785
4450	390	4840
4500	390	4890


Solomatic II 80

hl	hs	Alto total
1000	185	1185
1050	195	1245
1100	195	1295
1150	205	1355
1200	205	1405
1250	205	1455
1300	205	1505
1350	205	1555
1400	205	1605
1450	205	1655
1500	205	1705
1550	220	1770
1600	220	1820
1650	220	1870
1700	220	1920
1750	230	1980
1800	230	2030
1850	230	2080
1900	230	2130
1950	230	2180
2000	230	2230
2050	240	2290
2100	240	2340
2150	240	2390


hl	hs	Alto total
2200	240	2440
2250	255	2505
2300	255	2555
2350	255	2605
2400	255	2655
2450	255	2705
2500	255	2755
2550	265	2815
2600	265	2865
2650	265	2915
2700	265	2965
2750	280	3030
2800	280	3080
2850	280	3130
2900	280	3180
2950	280	3230
3000	280	3280
3050	290	3340
3100	290	3390
3150	290	3440
3200	290	3490
3250	300	3550
3300	300	3600
3350	300	3650

hl	hs	Alto total
3400	300	3700
3450	300	3750
3500	300	3800
3550	315	3865
3600	315	3915
3650	315	3965
3700	315	4015
3750	325	4075
3800	325	4125
3850	325	4175
3900	325	4225
3950	325	4275
4000	325	4325
4050	335	4385
4100	335	4435
4150	335	4485
4200	335	4535
4250	350	4600
4300	350	4650
4350	350	4700
4400	350	4750
4450	350	4800
4500	350	4850


Opción cable intramuros



Opción tapa/cajón (Solo en montajes intramuros)

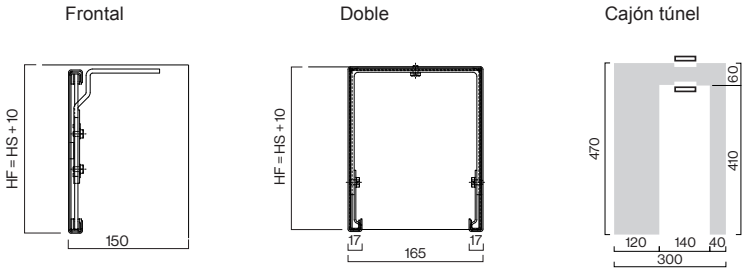

Montaje



Firma administración

Imprimir

Guardar

Borrar

Enviar
